

CYBERILL

SENTRY

Calendrier Strategique de Realisation

Security Monitoring & Threat Intelligence Platform

Organisation: CYBERILL (cyberill-projekt)

Depot: github.com/cyberill-projekt/cyberill-sec

Version: v1.0

Date: 28 Juillet 2026

Duree: 9 semaines | Charge: ~51h | Budget: 0 EUR

Table des Matieres

1	Analyse SWOAT	3
2	Analyse des Besoins	5
3	Objectifs SMART	7
4	Prerequis	9
5	Calendrier de Realisation	10
5.1	Phase 1: Foundation	11
5.2	Phase 2: Threat Feeds	12
5.3	Phase 3: CVE Tracker	13
5.4	Phase 4: Incident Management	14
5.5	Phase 5: SOC Dashboard	15
5.6	Phase 6: Threat Hunting	16
6	Diagramme de Gantt	17
7	Budget et Ressources	18
8	Risques et Mitigation	19
9	Roadmap Post-v1.0	20

1. Analyse SWOAT

Forces (Strengths)

- Architecture modulaire — FastAPI modulaire, chaque module (feeds, CVE, incidents) est independant. Facilite le developpement parallele et la maintenance.
- Stack eprouvee — Python/FastAPI/PostgreSQL/Redis — large communaute, fiable, documentation abondante.
- Double interface — Click CLI + REST API pour flexibilite d'usage (humain + machine).
- Containerise — Docker Compose pour un deploiement reproductible.
- Approche TDD — Tests avant code, couverture systematique, regression controlee.
- Vision claire — 6 modules bien definis, roadmap tracee, pas de derive fonctionnelle.

Faiblesses (Weaknesses)

- Ressources limitees — Projet solo (Godwill Foka). Mitigation : priorisation stricte, phases iteratives.
- Jeunesse du projet — Aucun utilisateur ni feedback reel. Mitigation : MVP rapide pour valider le besoin.
- Securite a prouver — Plateforme de securite doit etre irreprochable. Mitigation : audit de code a chaque phase.
- Dependance NVD API — CVE Tracker depend d'une API externe. Mitigation : fallback prevu, cache local.

Opportunités (Opportunities)

- Marche TI en explosion — Demande croissante en Threat Intelligence (2025-2028).
- PME/ETI non equipees — Grandes entreprises ont des solutions cheres, les PME n'ont rien. Creneau accessible.
- IA dans la cybersécurité — Possibilite d'integrer du ML pour la correlation automatique (Phase 6+).
- Marche franco-allemand — Positionnement Berlin + France comme avantage concurrentiel.
- Open Source — Publier en open source = credibilite + communaute (apres v1 stable).

Aspirations (Aspirations)

- Plateforme TI de reference pour PME/ETI francophones — 100 utilisateurs actifs en 12 mois.
- Support pedagogique pour Cyberill Academy — Integration aux formations en 6 mois.
- Version SaaS sur Cyberill Cloud — Module cloud natif en 12-18 mois.
- Communaute open source — 50+ contributeurs en 18 mois.
- Certification ISO 27001 pour la plateforme — Conformite en 24 mois.

Menaces (Threats)

- Concurrents etablis (MISP, OpenCTI, TheHive) — Impact eleve. Contre-mesure : focus sur creneau PME, simplicite.
- Evolution rapide des menaces — Impact moyen. Contre-mesure : architecture flexible, mises a jour regulieres.
- Reglementation (NIS2, DORA) — Impact moyen. Contre-mesure : concue pour evoluer vers la conformite.
- Disponibilite limitee du porteur — Impact eleve. Contre-mesure : roadmap realiste, phases priorisees.

2. Analyse des Besoins

Besoins Fonctionnels

ID	Besoin	Priorite	Phase
BF-01	Collecter des flux TI multi-sources	Critique	P2
BF-02	Normaliser et stocker les IOC	Critique	P2
BF-03	Surveiller les CVE depuis NVD	Critique	P3
BF-04	Alerter sur les CVEs critiques	Haute	P3
BF-05	Gerer le cycle de vie des incidents	Critique	P4
BF-06	Visualiser les KPIs sur dashboard	Haute	P5
BF-07	Regles de threat hunting	Moyenne	P6
BF-08	Administration via CLI	Haute	P1
BF-09	API REST complete	Critique	P1-P6
BF-10	Authentification utilisateurs	Critique	P1

Besoins Techniques

ID	Besoin	Priorite	Phase
BT-01	PostgreSQL + migrations Alembic	Critique	P1
BT-02	Cache Redis	Haute	P1
BT-03	Docker Compose	Haute	P1
BT-04	Tests automatises (>= 80%)	Critique	P1-P6
BT-05	API documentee (Swagger)	Haute	P1
BT-06	CI/CD (GitHub Actions)	Moyenne	P1
BT-07	Secrets et variables d'env	Critique	P1
BT-08	Logging structure	Haute	P1

Besoins Utilisateurs

ID	Persona	Besoin	Priorite
BU-01	Analyste SOC	Dashboard temps reel	Critique
BU-02	Analyste SOC	Alertes CVEs critiques	Critique
BU-03	Resp. Securite	Suivi incidents	Critique
BU-04	Chercheur	Interrogation IOC via CLI	Haute
BU-05	Admin	Gestion sources TI	Haute

ID	Persona	Besoin	Priorite
BU-06	Pentester	Donnees pour tests offensifs	Moyenne

3. Objectifs SMART

Objectif General

Construire et deployer SENTRY v1.0, une plateforme operationnelle de Threat Intelligence et Security Monitoring, capable de collecter des flux TI, tracker les CVE, gerer les incidents, et fournir un dashboard SOC en 9 semaines.

ID	Objectif	Echeance	Jalon
O-01	Squelette projet operationnel (API	Semaine 1	J7
O-02	3 sources TI integrees (OTX, MISP,	Semaine 3	J21
O-03	500+ IOC collectes et stockes en ba	Semaine 4	J28
O-04	Tracking CVE avec monitoring NVD +	Semaine 5	J35
O-05	100% CVEs critiques (CVSS >= 9.0) c	Semaine 5	J35
O-06	Module Incident Management complet	Semaine 7	J49
O-07	Dashboard SOC avec 3 vues (summary,	Semaine 8	J56
O-08	5 regles de threat hunting operatio	Semaine 9	J63
O-09	Couverture de tests >= 80%	Continu	J63
O-10	API documentee (Swagger) + CLI + RE	Chaque phase	J63

4. Prerequis

Pre-requis Techniques

Pre-requis	Statut
Python >= 3.11	OK
PostgreSQL 16	Semaine 1 (Docker)
Redis 7	Semaine 1 (Docker)
Docker + Compose	OK
pip (gestionnaire paquets)	OK
Git configure	OK
Acces GitHub (cyberill-projekt)	OK
Cle API AlienVault OTX	Semaine 2 (gratuit)
Token NVD API 2.0	Semaine 4 (gratuit)

Connaissances Requises

Connaissance	Niveau
Python avance (async/await, FastAPI)	Maitrise
SQLAlchemy 2.0 / Alembic	Maitrise
Threat Intelligence (STIX, TAXII)	A revoir (Semaine 2)
NVD API 2.0	Decouverte (Semaine 4)
Docker / Compose	Maitrise
Tests async (pytest-asyncio)	Maitrise

Pre-requis Organisationnels

Ressource	Statut
Budget temps : 5-10h/semaine	A confirmer
Environnement de dev stable	OK (VM Linux)
Connexion internet stable	OK
Comptes API (OTX, NVD, MISP)	Semaine 2-4

5. Calendrier de Realisation

Calendrier Global

Duree totale : 9 semaines | Charge estimee : ~51h | 6 phases developpement | 6 jalons de validation

Phase	Module	Periode	Duree	Charge	Livrable
P1	Foundation	J1-J7	1 semaine	8h	Squelette projet operationnel
P2	Threat Feeds	J8-J21	2 semaines	12h	3 sources, 500+ IOC
P3	CVE Tracker	J22-J35	2 semaines	10h	Monitoring NVD + alerting
P4	Incident Mgmt	J36-J49	2 semaines	10h	Cycle de vie incidents
P5	SOC Dashboard	J50-J56	1 semaine	6h	KPIs, timeline, export
P6	Threat Hunting	J57-J63	1 semaine	5h	5 regles de chasse

5.1 Phase 1: Foundation (J1-J7)

Mise en place du squelette du projet : FastAPI, PostgreSQL, Redis, CLI Click, Docker Compose, et structure modulaire des 6 modules. Tests async configures avec pytest.

Task	Description	Duree	Dep.
1.1	Structure projet + pyproject.toml +	30min	-
1.2	Base de donnees + Modele User + Ale	30min	1.1
1.3	CLI Click (db init, seed, version)	20min	1.2
1.4	Docker Compose (PostgreSQL + Redis)	20min	1.1
1.5	Structure module threat_feeds (vide	15min	1.2
1.6	Structure module cve_tracker (vide)	15min	1.2
1.7	Structure module incidents (vide)	15min	1.2
1.8	Pytest config + async fixtures	20min	1.1

M1
Squelette operationnel

J7

API + DB + CLI + Docker OK

5.2 Phase 2: Threat Feeds (J8-J21)

Collecte, parsing et stockage des indicateurs de compromission (IOC) depuis 3+ sources de flux Threat Intelligence. Worker asynchrone et CLI de gestion.

Task	Description	Duree	Dep.
2.1	Modele ThreatFeed + migration	20min	P1
2.2	CRUD API /api/v1/feeds	30min	2.1
2.3	Collecteur asynchrone + parsers	40min	2.2
2.4	Modele Indicator + migration	20min	2.1
2.5	Stockage IOC + deduplication	30min	2.4
2.6	Worker periodique (background tasks)	25min	2.3,2.5
2.7	CLI feeds (list/add/fetch/fetch-all)	25min	2.6
2.8	Tests module threat_feeds	30min	2.2-2.7
2.9	Integration source AlienVault OTX	20min	2.6
2.10	Integration flux STIX/TAXII	30min	2.6

M2 Threat Feeds operationnel

J21

3 sources, 500+ IOC

5.3 Phase 3: CVE Tracker (J22-J35)

Surveillance des CVEs en temps reel via NVD API 2.0, avec systeme d>alerting configurable par seuil de severite et mots-cles.

Task	Description	Duree	Dep.
3.1	Modele CVE + migration	20min	P1
3.2	Collecteur NVD API	30min	3.1
3.3	Parser CVE et normalisation	20min	3.2
3.4	Filtrage et recherche (severite, da	25min	3.3
3.5	API /api/v1/cves	30min	3.1
3.6	Systeme d>alerting (seuils CVSS, mo	30min	3.4
3.7	CLI cves (list/search/alert)	20min	3.5,3.6
3.8	Tests module cve_tracker	25min	3.1-3.7

M3 CVE Tracker operationnel

J35

Monitoring NVD + alerting

5.4 Phase 4: Incident Management (J36-J49)

Gestion complete du cycle de vie des incidents de securite : creation, investigation, conteneurisation, eradication, retablissement et cloture avec timeline d'evenements.

Task	Description	Duree	Dep.
4.1	Modele Incident + migration	20min	P1
4.2	Modele IncidentEvent (timeline) + m	15min	4.1
4.3	Workflow de statuts (6 etats)	25min	4.1
4.4	API CRUD /api/v1/incidents	30min	4.1
4.5	API timeline d'evenements	20min	4.2
4.6	Liaison incidents (IOC/CVE)	25min	4.4, P2, P3
4.7	CLI incidents (list/create/close)	20min	4.4
4.8	Tests module incidents	25min	4.1-4.7

M4**Incident Management operationnel**

J49

Cycle de vie complet

5.5 Phase 5: SOC Dashboard (J50-J56)

Dashboard de visualisation des KPIs de securite avec endpoints de statistiques, vue console et export de donnees.

Task	Description	Duree	Dep.
5.1	Endpoint /api/v1/dashboard/summary	30min	P2,P3,P4
5.2	Endpoint recent-threats	20min	P2
5.3	Endpoint timeline (7 jours)	20min	P4
5.4	Vue console (CLI dashboard show)	25min	5.1-5.3
5.5	Export JSON/CSV	15min	5.4
5.6	Tests module dashboard	20min	5.1-5.5

M5**SOC Dashboard operationnel**

J56

KPIs, timeline, export

5.6 Phase 6: Threat Hunting (J57-J63)

Moteur de regles de chasse aux menaces avec pattern matching, correlation d'evenements, et generation de rapports.

Task	Description	Duree	Dep.
6.1	Moteur de regles (pattern matching,	30min	P2,P3,P4


Task	Description	Duree	Dep.
6.2	5 regles de hunting operationnelles	25min	6.1
6.3	API /api/v1/hunt/rules + /run	20min	6.1,6.2
6.4	CLI hunt (run/list-rules/results)	20min	6.3
6.5	Tests module threat_hunting	20min	6.1-6.4

M6**Threat Hunting operationnel**

J63

5 regles operationnelles

6. Diagramme de Gantt

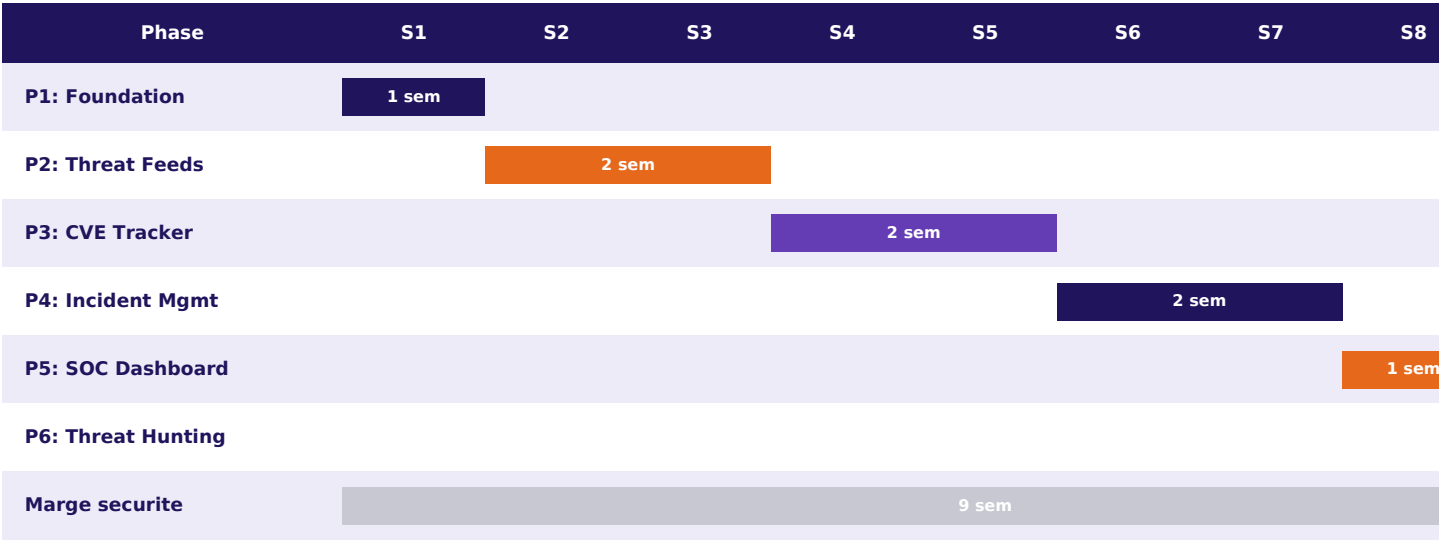

Jalons

MM1	Squelette operationnel	J7	OK
MM2	Threat Feeds OK	J21	OK
MM3	CVE Tracker OK	J35	OK
MM4	Incident Mgmt OK	J49	OK
MM5	Dashboard OK	J56	OK
MM6	SENTRY v1.0	J63	OK

7. Budget et Ressources

Charge de Travail Estimee

Phase	Duree	Charge	%
P1: Foundation	1 semaine	8h	16%
P2: Threat Feeds	2 semaines	12h	24%
P3: CVE Tracker	2 semaines	10h	20%
P4: Incident Management	2 semaines	10h	20%
P5: SOC Dashboard	1 semaine	6h	12%
P6: Threat Hunting	1 semaine	5h	10%
TOTAL	9 semaines	51h	100%

Rythme Recommande

6h/semaine pour tenir le calendrier de 9 semaines. Soit ~2 sessions de 3h par semaine, ou 1 session de 6h le week-end.

Dependances Externes (Cout Zero)

Ressource	Type	Cout	Acquisition
AlienVault OTX	API gratuite	0 EUR	Semaine 2
NVD API 2.0	API gratuite	0 EUR	Semaine 4
MISP (instance publique)	Open Source	0 EUR	Semaine 3
GitHub Actions	CI/CD public	0 EUR	Semaine 1
Docker Hub	Registry	0 EUR	Semaine 1

8. Risques et Mitigation

Risque	Probabilite	Impact	Mitigation
Indisponibilite porteur	Moyenne	Eleve	Marge 1-2j par phase
API NVD en panne	Faible	Moyen	Cache local + fallback
Bug critique en production	Faible	Eleve	Tests TDD + code review
Scope creep	Elevee	Eleve	Respect strict du plan, v2 ulterieu
Prob. technique env. dev	Moyenne	Moyen	Docker, environnement reproductible

Strategie de Mitigation Globale

Approche TDD (tests avant code) pour reduire les bugs. Revue de code systematique a chaque jalon. Marge de securite de 1-2 jours par phase. Engagement sur le perimetre strict du plan sans ajout de features.

9. Roadmap Post-v1.0

Apres la livraison de SENTRY v1.0, la feuille de route prevoit les evolutions suivantes :

Version	Horizon	Contenu	Statut
v1.0	Sept 2026	Modules de base operationnels	Fondee
v1.1	+ 4 sem.	Authentification JWT, roles utiliza	A planifier
v1.2	+ 8 sem.	Interface web (React basique)	A planifier
v2.0	+ 16 sem.	Multi-tenant, pret pour le SaaS	Vision
v2.1	+ 20 sem.	ML pour correlation automatique	Vision
v3.0	+ 24 sem.	Deploiement Cyberill Cloud	Vision

SENTRY v1.0 - Pret pour le developpement

*Projet CYBERILL | CyberillSec | github.com/cyberill-projekt/cyberill-sec
Document genere le 28 Juillet 2026*
